




**Отчёт о ходе реализации проектов  
муниципального образования Сургутский  
район, запущенных в рамках проектного  
управления**

# «Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок реализации:  
2016-2019 гг.

## Календарный план проекта

№ п/п	КТ	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	январь.18	февраль.18	март.18	апрель.18	май.18	июнь.18	июль.18
1.		<b>Заключение инвестиционного договора</b>	01.07.2017	07.08.2017	✔								
1.4.	🚩	В результате конкурсных процедур определен инвестор и заключен инвестиционный договор	07.08.2017	07.08.2017	✔	В.В. Матаев							
2.		<b>Обеспечение объекта сетями инженерной инфраструктуры (сети теплоснабжения, водоснабжения, связи)</b>	05.07.2017	23.11.2017	✔								
2.4.	🚩	Объект обеспечен сетями инженерной инфраструктуры (сети теплоснабжения, водоснабжения, связи)	23.11.2017	23.11.2017	✔	А.О. Атоян							
3.		<b>Строительство и оснащение объекта</b>	08.08.2017	31.10.2018	🕒								
3.2.	🚩	Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка (получена выписка из ЕГРН)	29.08.2017	29.08.2017	✔	В.А. Шагин							
3.5.	🚩	Разрешение на строительство выдано инвестору	14.11.2017	14.11.2017	✔	А.О. Атоян							
3.6.		СМР. Проконтролировать проведение инвестором строительно-монтажных, пуско-наладочных работ	15.11.2017	30.09.2018	🕒	А.О. Атоян							
3.7.		Проконтролировать предоставление инвестором документов, необходимых для выдачи инвестором разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2018	24.10.2018		А.О. Атоян							
3.8.		Выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	25.10.2018	30.10.2018		А.О. Атоян							
3.9.	🚩	<b>Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано инвестору</b>	31.10.2018	31.10.2018		А. О. Атоян							
4.		<b>Приобретение объекта</b>	15.03.2018	10.02.2019	🕒								
4.1.		Направить заявку об осуществлении бюджетных инвестиций на выкуп объекта в комиссию по отбору объектов инвестиций	15.03.2018	01.05.2018	✔	О.И. Кочурова							
4.2.		Подготовить, обеспечить подписание протокола заседания комиссии по отбору объектов инвестиций	02.05.2018	20.07.2018	✔	А.О. Атоян							
4.3.		Обеспечить принятие Решения Думы Сургутского района о выделении денежных средств на приобретение объекта	21.07.2018	30.09.2018		О.И. Кочурова							
4.4.		Внести изменения в муниципальную программу "Образование Сургутского района"	01.10.2018	10.11.2018		О.И. Кочурова							
4.5.	🚩	<b>Обеспечено софинансирование расходных обязательств по приобретению объекта за счет бюджета МО Сургутский район</b>	11.11.2018	11.11.2018		О.И. Кочурова							
4.6.		Направить заявку в ДО и МП ХМАО–Югры на выделение субсидии из бюджета	15.03.2018	01.07.2018	✔	О.И. Кочурова							
4.7.		Проконтролировать регистрацию права собственности инвестора на объект	01.11.2018	29.11.2018		В.А. Шагин							
4.8.	🚩	<b>Получена информация от инвестора о регистрации права собственности на объект</b>	30.11.2018	30.11.2018		В.А. Шагин							



Условные обозначения:

- контрольная точка
- исполнение 100%
- исполняется
- не исполнено
- до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

- плановый период исполнения
- контрольная точка плановая
- фактическое исполнение
- контрольная точка достигнута
- контрольная точка не достигнута


«Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок реализации:  
2016-2019 гг.

График выполнения работ

Выполнено на 01.06.2018

Земляные работы/свайные работы	100%
Общестроительные работы ниже отметки 0,000 (ростверки, ФБС)	100%
Кирпичная кладка стен и перегородок	88%
Заполнение оконных и дверных проемов	65%
Устройство кровли	20%
Внутренние инженерные коммуникации	15%

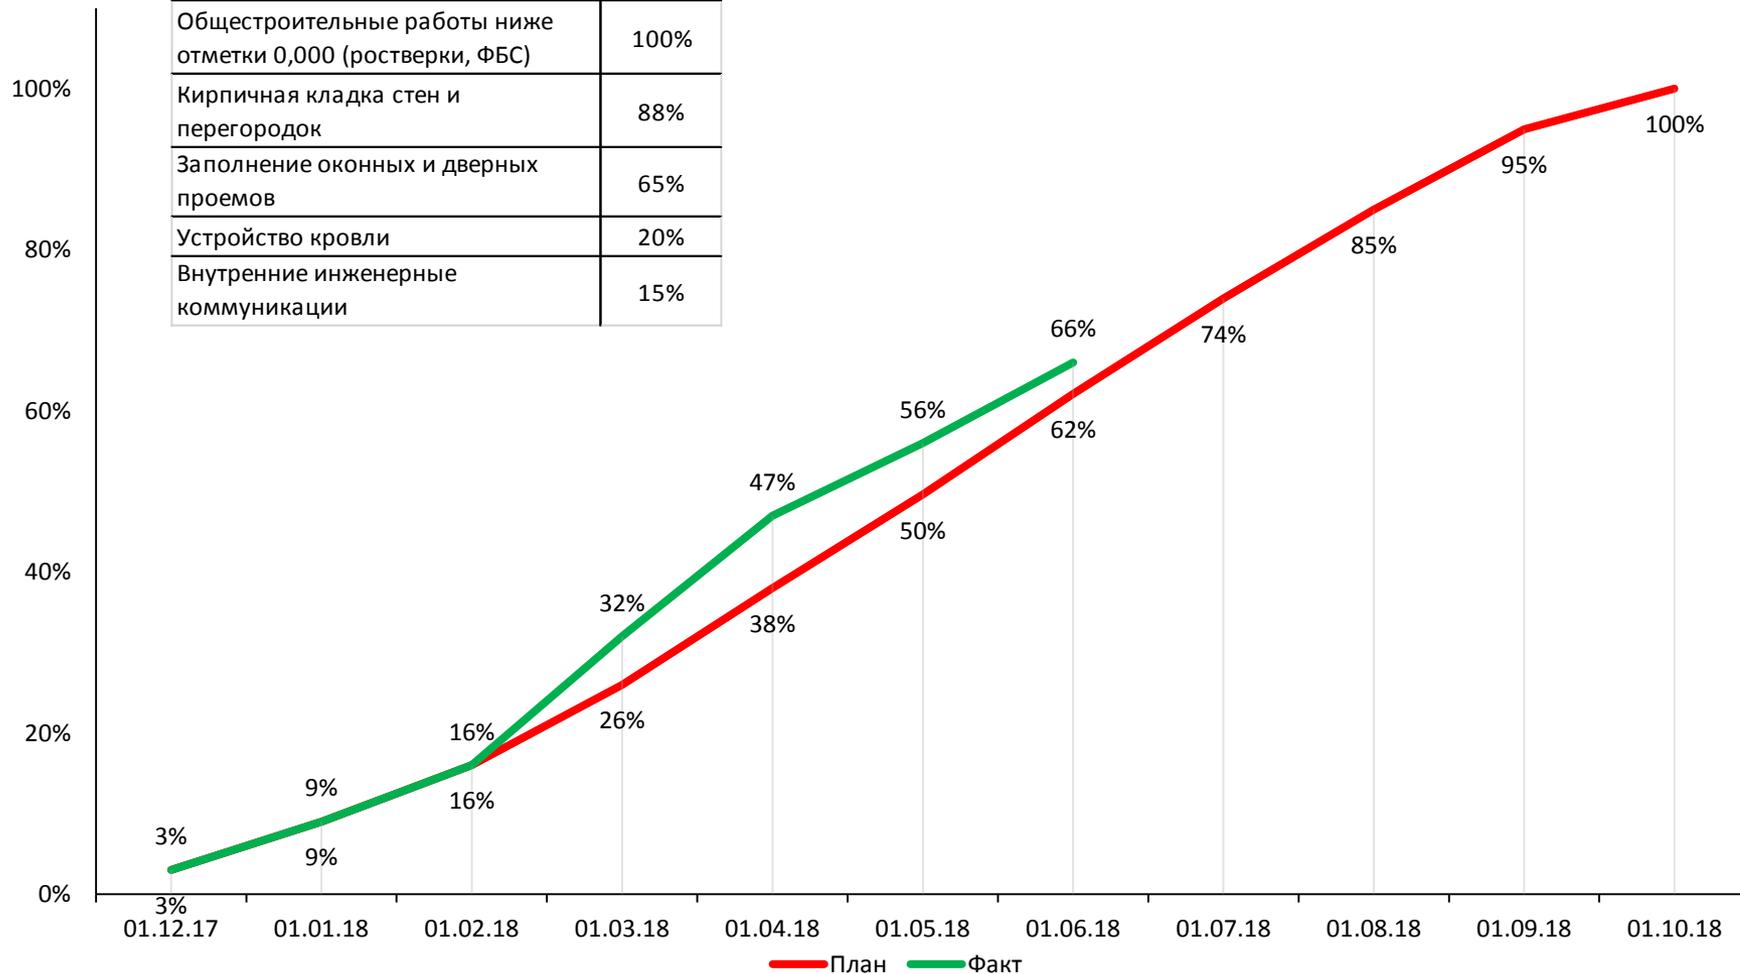

«Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок  
реализации:  
2016-2019 гг.



# «Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок реализации:  
2018-2021 гг.

## Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	сент.17	окт.17	ноя.17	дек.17	январ.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18
1.		<b>Заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта (без проведения конкурса)</b>	15.09.2017	21.09.2018	●											
1.1.		Сформировать проект концессионного соглашения с учетом предложений инициатора	15.09.2017	31.10.2017	●	Кочурова О.И.										
1.2.		Согласовать с отраслевыми органами проект концессионного соглашения	01.11.2017	28.02.2018	●	Кочурова О.И.										
1.3.		Подготовить проект конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения	01.11.2017	28.02.2018	●	Кочурова О.И.										
1.4.		Направить в ДОИМП ХМАО-Югры заявку о предоставлении	20.02.2018	28.02.2018	●	Кочурова О.И.										
1.5.	🚩	<b>В ДОИМП ХМАО-Югры направлена заявка о предоставл. субсидии</b>	01.03.2018	01.03.2018	●	Кочурова О.И.										
1.6.		Заключить соглашение между МО Сургутский район и ДОИМП ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на финансирование	02.03.2018	20.06.2018	●	Кочурова О.И.										
1.7.		Согласовать проект концессионного соглашения с внесенными изменениями	02.03.2018	20.06.2018	●	Кочурова О.И.										
1.8.		Разместить предложение инициатора на сайте www.torgi.gov.ru	21.06.2018	25.06.2018		Кочурова О.И.										
1.9.		Обеспечить прием заявок о готовности к участию в конкурсе	26.06.2018	10.08.2018		Кочурова О.И.										
1.10.		Обеспечить подготовку и утверждение постановления администрации Сургутского района о заключении концессионного	11.08.2018	21.08.2018		Мельникова Е.П.										
1.11.		Направить концессионеру проект концессионного соглашения для подписания	22.08.2018	29.08.2018		Мельникова Е.П.										
1.12.		Обеспечить заключение концессионного соглашения	30.08.2018	20.09.2018		Кочурова О.И.										
1.13.	🚩	<b>Концессионное соглашение заключено</b>	21.09.2018	21.09.2018		Кочурова О.И.										
2.		<b>Организационно-техническое обеспечение проекта</b>	09.04.2018	01.12.2019	●											
2.1.		Сформировать земельные участки под строительство инженерных сетей и блочно-модульной котельной	09.04.2018	01.06.2018	●	Шагин В.А.										
2.2.		Осуществить вынос за границы земельного участка сетей электропитания	02.05.2018	01.06.2018	●	Кузьмина Д.В.										
2.3.		Осуществить вынос за границы земельного участка сетей инженерно-технического обеспечения	02.05.2018	13.09.2019		Атоян А.О.										
2.4.	🚩	<b>Транзитные сети вынесены за границы земельного участка</b>	14.09.2019	14.09.2019		Атоян А.О.										

### Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка плановая
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

# «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Срок реализации:  
2018-2020 гг.

## Календарный план проекта

№п/п	КТ	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18
1.		<b>Обеспечение финансирования мероприятий по созданию объекта</b>	<b>30.11.2017</b>	<b>20.06.2018</b>	☾								
1.2.	🚩	<b>Земельный участок поставлен на кадастровый учет</b>	<b>19.03.2018</b>	<b>19.03.2018</b>	☑	<b>В.А. Шагин</b>							
1.3.		Подготовить проект концессионного соглашения	26.12.2017	06.02.2018	☑	О.А. Кочурова							
1.4.		Подготовить проект конкурсной документации	26.12.2017	06.02.2018	☑	О.А. Кочурова							
1.5.		Направить в ДО и МП ХМАО-Югры заявку о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта	07.02.2018	08.02.2018	☑	О.И. Кочурова							
1.6.		Заключить соглашение между МО Сургутский район и ДО и МП ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	09.02.2018	19.06.2018	☾	О.И. Кочурова							
1.7.	🚩	<b>Соглашение между МО Сургутский район и ДО и МП ХМАО-Югры о предоставлении субсидии заключено</b>	<b>20.06.2018</b>	<b>20.06.2018</b>		<b>О.И. Кочурова</b>							
		<b>Заключение концессионного соглашения (частная инициатива)</b>	<b>30.05.2018</b>	<b>21.09.2018</b>	☾								
2.1.		Обеспечить утверждение постановления о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения соглашения	30.05.2018	15.06.2018	☾	О.И. Кочурова							
2.2.		Проект концессионного соглашения с внесёнными изменениями по результатам переговоров согласован	16.06.2018	20.06.2018		Ю.В. Маркова							
2.3.		Разместить предложение инициатора на сайт www.torgi.gov.ru	21.06.2018	22.06.2018		О.И. Кочурова							
2.4.		Обеспечить приём заявок о готовности к участию в конкурсе	26.06.2018	10.08.2018		О.И. Кочурова							
2.5.		Обеспечить утверждение постановления АСР о принятии решения о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса	11.08.2018	21.08.2018		Е.П. Мельникова							
2.6.		Направить концессионеру проект концессионного соглашения для подписания	22.08.2018	29.08.2018		Е.П. Мельникова							
2.7.		Обеспечить заключение концессионного соглашения	30.08.2018	20.09.2018		О.И. Кочурова							
2.8.	🚩	<b>Концессионное соглашение заключено</b>	<b>21.09.2018</b>	<b>21.09.2018</b>		<b>О.И. Кочурова</b>							
3.		<b>Освобождение земельного участка от транзитных сетей и иных объектов</b>	<b>30.11.2017</b>	<b>21.10.2018</b>	☾								
3.4.	🚩	<b>Транзитные инженерные коммуникации в границах земельного участка отсутствуют</b>	<b>01.06.2018</b>	<b>01.06.2018</b>	☑	<b>Д.В. Кузьмина</b>							
3.5.		Осуществить вынос гаражей за границы земельного участка	27.03.2018	20.10.2018		И.В. Наумов							
3.6.	🚩	<b>Осуществлен вынос гаражей за границы земельного участка</b>	<b>21.10.2018</b>	<b>21.10.2018</b>		<b>И.В. Наумов</b>							

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

# «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8»

Срок реализации:  
2016-2020 гг.

## Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	мар.18	апр.18	май.18	июн.18
<b>1.</b>		<b>Заключение инвестиционного договора</b>	<b>01.03.2018</b>	<b>10.08.2018</b>	☾					
1.1.		Получить заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры	01.03.2018	01.08.2018	☾	О.И. Кочурова				
1.2.		Объявить конкурс на право заключения инвестиционного договора	01.01.2018	02.07.2018	☑	О.И. Кочурова				
1.3.		Подвести итоги конкурса	03.07.2018	31.07.2018		О.И. Кочурова				
1.4.		Направить инвестору проект инвест. договора для подписания	01.08.2018	03.08.2018		Е.П. Мельникова				
1.5.		Обеспечить заключение инвестиционного договора	04.08.2018	09.08.2018		Е.П. Мельникова				
<b>1.6.</b>	🚩	<b>Иинвестиционный договор заключен</b>	<b>10.08.2018</b>	<b>10.08.2018</b>		<b>Е.П. Мельникова</b>				

### Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

# «Детский сад, п. Солнечный»

Срок реализации:  
2016-2020 гг.

## Календарный план проекта

№п/п	КТ	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	январь.18	февраль.18	март.18	апрель.18	май.18	июнь.18
1.		<b>Заключение инвестиционного договора</b>	<b>01.09.2017</b>	<b>15.05.2018</b>	✓							
1.1.		Произвести корректировку границ земельного участка, поставить на кадастровый учет	01.09.2017	19.03.2018	✓	В.А. Шагин						
1.2.		Подготовить проект инвестиционного договора	20.03.2018	01.04.2018	✓	В.В. Матаев						
1.3.		Конкурсная документация на право заключения инвестиционного договора утверждена	02.04.2018	05.04.2018	✓	В.В. Матаев						
1.4.		Организовать и провести конкурсные процедуры на право заключения инвестиционного договора	06.04.2018	03.05.2018	✓	В.В. Матаев						
1.5.		Обеспечить заключение инвестиционного договора	04.05.2018	14.05.2018	✓	В.В. Матаев						
1.6.	🚩	<b>Инвестиционный договор заключен</b>	<b>15.05.2018</b>	<b>15.05.2018</b>	✓	<b>В.В. Матаев</b>						
2.		<b>Организационно-техническое обеспечение проекта</b>	<b>01.09.2017</b>	<b>02.09.2019</b>	⦿							
2.1.		Получить заключение о проверке инвест. проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры	01.09.2017	10.06.2018	✓	О.И. Кочурова						
2.2.		Осуществить вынос за границы земельного участка сетей электроснабжения	01.09.2017	16.03.2018	✓	Д.В. Кузьмина						
2.3.		Осуществить вынос за границы земельного участка сетей инженерно-технического обеспечения	01.09.2017	01.06.2018	✓	Д.В. Кузьмина						
2.4.		Обеспечить строительство проезда	01.01.2018	01.09.2019		А.О. Атоян						
2.5.		Обеспечить строительство сетей связи до границ ЗУ	01.01.2018	01.09.2019	⦿	А.О. Атоян						
2.6.	🚩	<b>Объект обеспечен сетями инженерной инфраструктуры</b>	<b>02.09.2019</b>	<b>02.09.2019</b>								
3.		<b>Строительство и оснащение объекта</b>	<b>16.05.2018</b>	<b>15.08.2020</b>	⦿							
3.1.		Заключить договор аренды земельного участка, осуществить государственную регистрацию прав на земельный участок	16.05.2018	15.06.2018	⦿	В.А. Шагин						
3.2.		Осуществить контроль за выполнением инвестором ПИР, получением заключений	16.06.2018	20.01.2019		А.О. Атоян						
3.3.		Обеспечить получение инвестором разрешения на строительство	21.01.2019	24.01.2019		А.О. Атоян						
3.4.	🚩	<b>Разрешение на строительство инвестором получено</b>	<b>25.01.2019</b>	<b>25.01.2019</b>		<b>А. О. Атоян</b>						

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

# «Детский сад на 150 мест в с. Угут»

Срок реализации:  
2015-2017 гг.

## Календарный план проекта

№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18
1.		<b>Ввод объекта в эксплуатацию</b>	19.06.2017	30.06.2017	✓								
1.2.	🚩	<b>Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано инвестору</b>	30.06.2017	30.06.2017	✓	Атоян А.О.							
2.		<b>Передача объекта в муниципальную собственность, приобретение оборудования</b>	01.07.2017	15.08.2018	🕒								
2.4.	🚩	<b>Заключено соглашение между МО СР и ДО и МП ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на выкуп оборудования</b>	25.04.2018	25.04.2018	✓	Кочурова О.И.							
2.5.		Подготовить и направить КЭР заявки на осуществление закупок на поставку оборудования	26.04.2018	25.05.2018	!	Кочурова О.И.							
2.6.		Организовать и обеспечить проведение аукционов на поставку оборудования	26.05.2018	16.07.2018		Матаев В.В.							
2.7.		Обеспечить заключение контрактов на поставку оборудования, подписание актов приема-передачи оборудования	17.07.2018	29.07.2018		Кочурова О.И.							
2.8.	🚩	<b>Заключены контракты на поставку оборудования, подписаны акты приема-передачи оборудования</b>	30.07.2018	30.07.2018		Кочурова О.И.							
2.9.		Обеспечить подписание акта приема-передачи имущества осуществить регистрацию перехода права собственности	16.07.2018	14.08.2018		Шагин В.А.							
2.10.	🚩	<b>Оформлено право муниципальной собственности на объект</b>	15.08.2018	15.08.2018		Шагин В.А.							
3.		<b>Запуск объекта</b>	16.04.2018	01.09.2018									
3.1.		Получить положительное заключение органов надзора	16.04.2018	21.05.2018	✓	Кочурова О.И.							
3.2.		Получить лицензию на образовательную деятельность	22.05.2018	08.06.2018	✓	Кочурова О.И.							
3.3.	🚩	<b>Получена лицензия на образовательную деятельность</b>	09.06.2018	09.06.2018	✓	Кочурова О.И.							
3.4.		Предоставить в ДИИЗО администрации Сургутского района перечень оборудования	31.07.2018	10.08.2018		Кочурова О.И.							
3.5.		Закрепить имущество на праве оперативного управления за бюджетным учреждением	11.08.2018	24.08.2018		Шагин В.А.							
3.6.	🚩	<b>Имущество закреплено на праве оперативного управления за бюджетным учреждением</b>	25.08.2018	25.08.2018		Шагин В.А.							
3.7.		Обеспечить утверждение штатного расписания	26.05.2018	15.08.2018	✓	Кочурова О.И.							
3.8.		Заключить трудовые договоры	26.05.2018	30.08.2018	✓	Кочурова О.И.							
3.9.	🚩	<b>Трудовые договоры заключены</b>	31.08.2018	31.08.2018	✓	Кочурова О.И.							
3.10.		Обеспечить приём и оформление детей	16.08.2018	31.08.2018		Кочурова О.И.							
3.11.	🚩	<b>Начато осуществление образовательной деятельности</b>	01.09.2018	01.09.2018		Кочурова О.И.							

Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка плановая
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута

# «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский»

Срок реализации:  
2017-2018 гг.

## Календарный план проекта


№ п/п	К Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18
1.		Заключение соглашения о взаимодействии	30.05.2017	15.07.2017	✓								
1.2.	🚩	Соглашение с администрацией гп Федоровский заключено	15.07.2017	15.07.2017	✓	Атоян А.О.							
2.		Заклучение контракта на выполнение СМР (начало стр-ва)	25.06.2017	15.08.2017	✓								
2.2.	🚩	Внесены изменения в план-график	04.07.2017	04.07.2017	✓	Атоян А.О.							
2.4.		Аукционная документация подготовлена	14.07.2017	14.07.2017	✓	Атоян А.О.							
2.6.	🚩	Заклучен контракт на выполнение СМР	15.08.2017	15.08.2017	✓	Атоян А.О.							
2.8.	🚩	Выдано разрешение на строительство	15.08.2017	15.08.2017	✓	Атоян А.О.							
3.		Осуществление строительства объекта (начало строительства)	16.08.2017	01.03.2018	✓								
3.4.	🚩	Муниципальный контракт №70 от 15.08.2017 расторгнут	01.03.2018	01.03.2018	✓	Атоян А.О.							
4.		Осуществление строительства объекта (продолжение строительства), передача объекта	12.02.2018	05.02.2019	●	Атоян А.О.							
4.1.		Произвести обоснование и расчёт НМЦК для проведения нового конкурса	12.02.2018	22.02.2018	✓	Атоян А.О.							
4.2.		Подготовить и направить в уполномоченный орган заявку на осуществление закупки	23.02.2018	11.03.2018	✓	Атоян А.О.							
4.4.	🚩	Извещение о проведении электронного аукциона на сайте <a href="http://zakupki.gov.ru">zakupki.gov.ru</a>	14.03.2018	14.03.2018	✓	Матаев В.В.							
4.5.		Провести аукцион	15.03.2018	09.04.2018	✓	Матаев В.В.							
4.6.	🚩	Подведены итоги аукциона	10.04.2018	10.04.2018	✓	Матаев В.В.							
4.7.		Заклучить муниципальный контракт на выполнение строительства объекта (продолжение строительства)	11.04.2018	22.04.2018	✓	Атоян А.О.							
4.8.	🚩	Заклучен муниципальный контракт на выполнение строительства объекта (продолжение строительства)	23.04.2018	23.04.2018	✓	Атоян А.О.							
4.9.		Выполнить 27% работ согласно графику производства работ	24.04.2018	30.06.2018	●	Атоян А.О.							
4.10.	🚩	Выполнено 27% работ согласно графику производства работ	01.07.2018	01.07.2018		Атоян А.О.							

Условные обозначения:

- 🚩 - контрольная точка
- ✓ - исполнение 100%
- - исполняется
- ! - не исполнено
- <7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней


- - плановый период исполнения
- - фактическое исполнение
- - контрольная точка плановая
- - контрольная точка достигнута
- - контрольная точка не достигнута

## Календарный план проекта

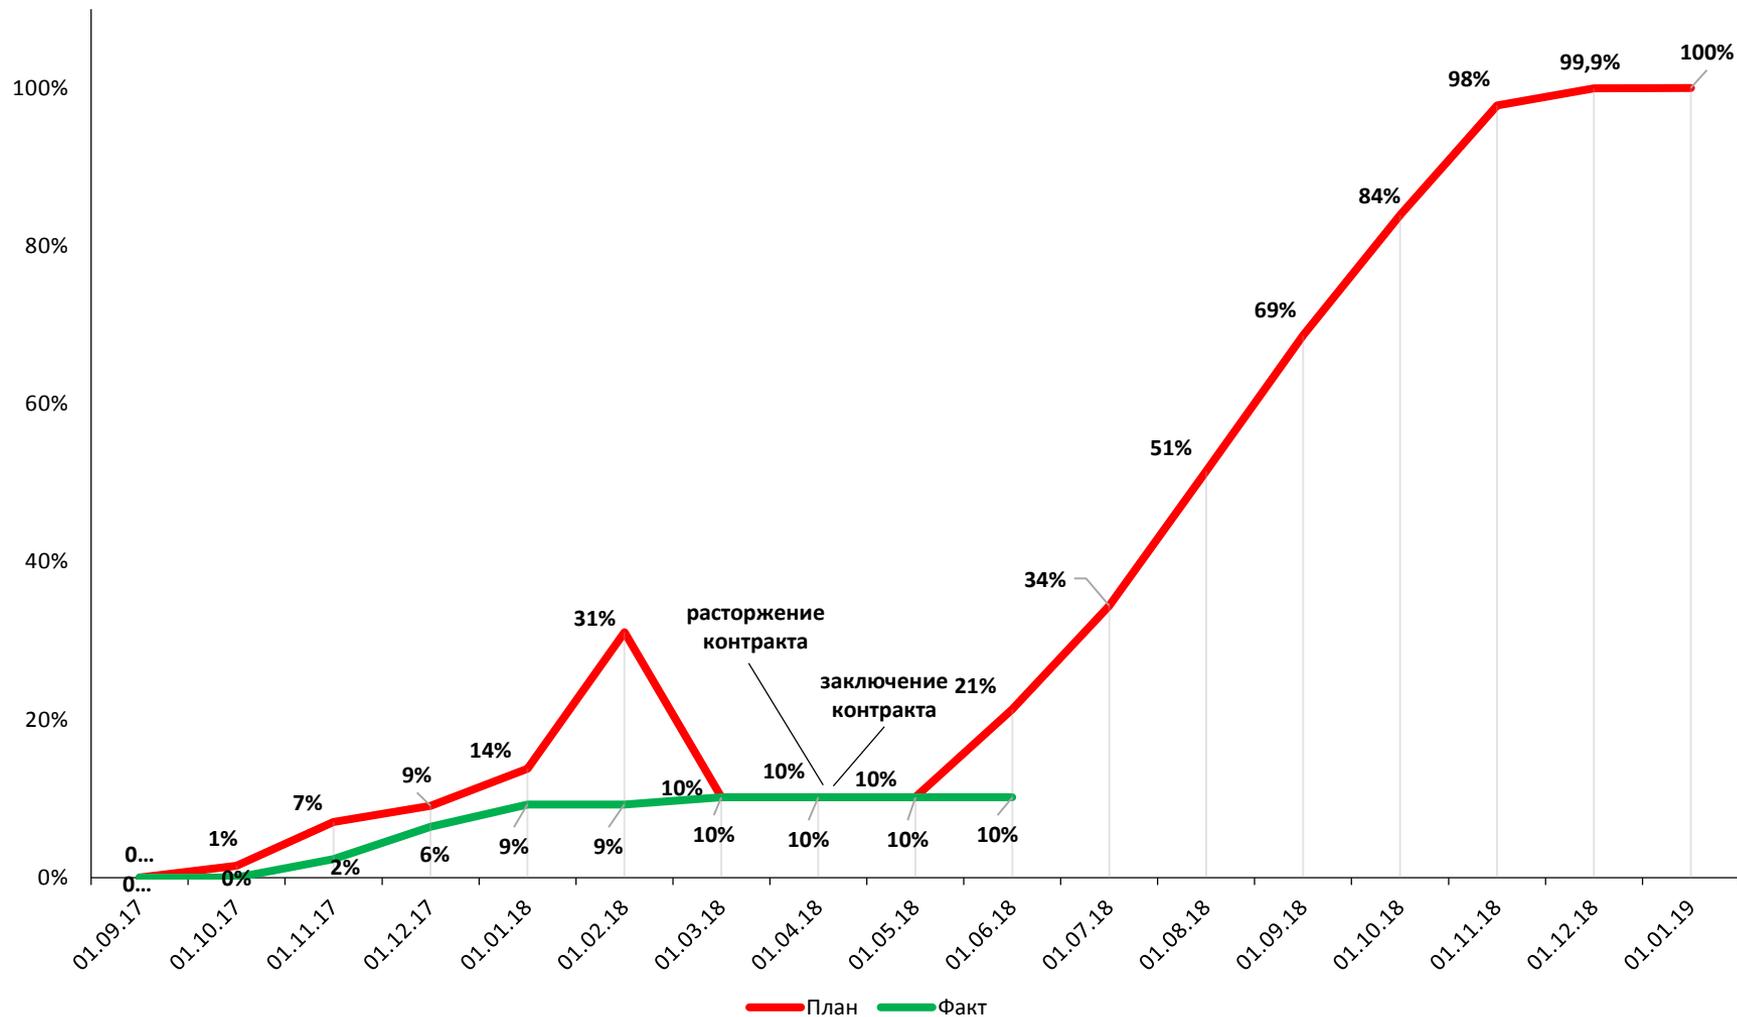

## Календарный план проекта

№п/п	К/Т	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Исполнение	Ответственный исполнитель	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18
<b>1.</b>		<b>Строительство объекта</b>	<b>29.06.2017</b>	<b>05.09.2018</b>	☾						
1.1.		Получить информацию от администрации г.п. Барсово о факте заключения ими договора аренды земельного участка	29.06.2017	30.06.2017	☑	Тирон С.М.					
1.2.		Выдать инвестору техническое задание	01.07.2017	05.07.2017	☑	Тирон С.М.					
1.3.		Проконтролировать подготовку инвестором проектной документации, предоставление документов, необходимых для	06.07.2017	26.07.2017	☑	Атоян А.О.					
1.4.		Выдать разрешение на строительство	27.07.2017	02.08.2017	☑	Атоян А.О.					
<b>1.5.</b>	🚩	<b>Разрешение на строительство выдано инвестору</b>	<b>03.08.2017</b>	<b>03.08.2017</b>	☑	<b>Атоян А.О.</b>					
1.6.		Проконтролировать выполнение инвестором строительно-монтажных, пуско-наладочных работ	04.08.2017	31.07.2018	☾	Атоян А. О.					
1.7.		Проконтролировать предоставление инвестором документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта в	01.08.2018	25.08.2018		Атоян А.О.					
1.8.		Выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	26.08.2018	04.09.2018		Атоян А.О.					
<b>1.9.</b>	🚩	<b>Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано инвестору</b>	<b>05.09.2018</b>	<b>05.09.2018</b>		<b>Атоян А.О.</b>					



### Условные обозначения:

-  - контрольная точка
-  - исполнение 100%
-  - исполняется
-  - не исполнено
-  - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-  - плановый период исполнения
-  - контрольная точка плановая
-  - фактическое исполнение
-  - контрольная точка достигнута
-  - контрольная точка не достигнута


# «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Барсово»

Срок реализации:  
2017-2018 гг.

## График выполнения работ

Выполнено на 01.06.2018

Вынос сетей теплоснабжения и ВЛ	100%
Монтаж сетей отопления и ВК	100%
Вертикальная планировка	50%
Устройство ж/б свай	100%
Устройство ж/б ростверков	100%
Монтаж фундаментных балок	100%
Устройство монолитной ж/б плиты на отм. +0,000	100%
Монтаж колонн металлических	100%
Монтаж ферм металлических	100%
Монтаж горизонтальных связей и балок	100%
Облицовка стеновыми панелями	100%
Монтаж окон, дверей наружных	100%
Устройство кровли	100%
Устройство входных групп	100%
Устройство внутренних стен, перегородок	100%
Устройство стяжки пола	100%
Отделка стен и перегородок	80%
Устройство финишного покрытия пола	30%
Монтаж подвесных потолков	20%
Монтаж дверей внутренних	20%
Монтаж систем ОВ, ВК, ЭС, ЭО, ОПС, слаботочных систем	70%
Монтаж внутреннего освещения	37%

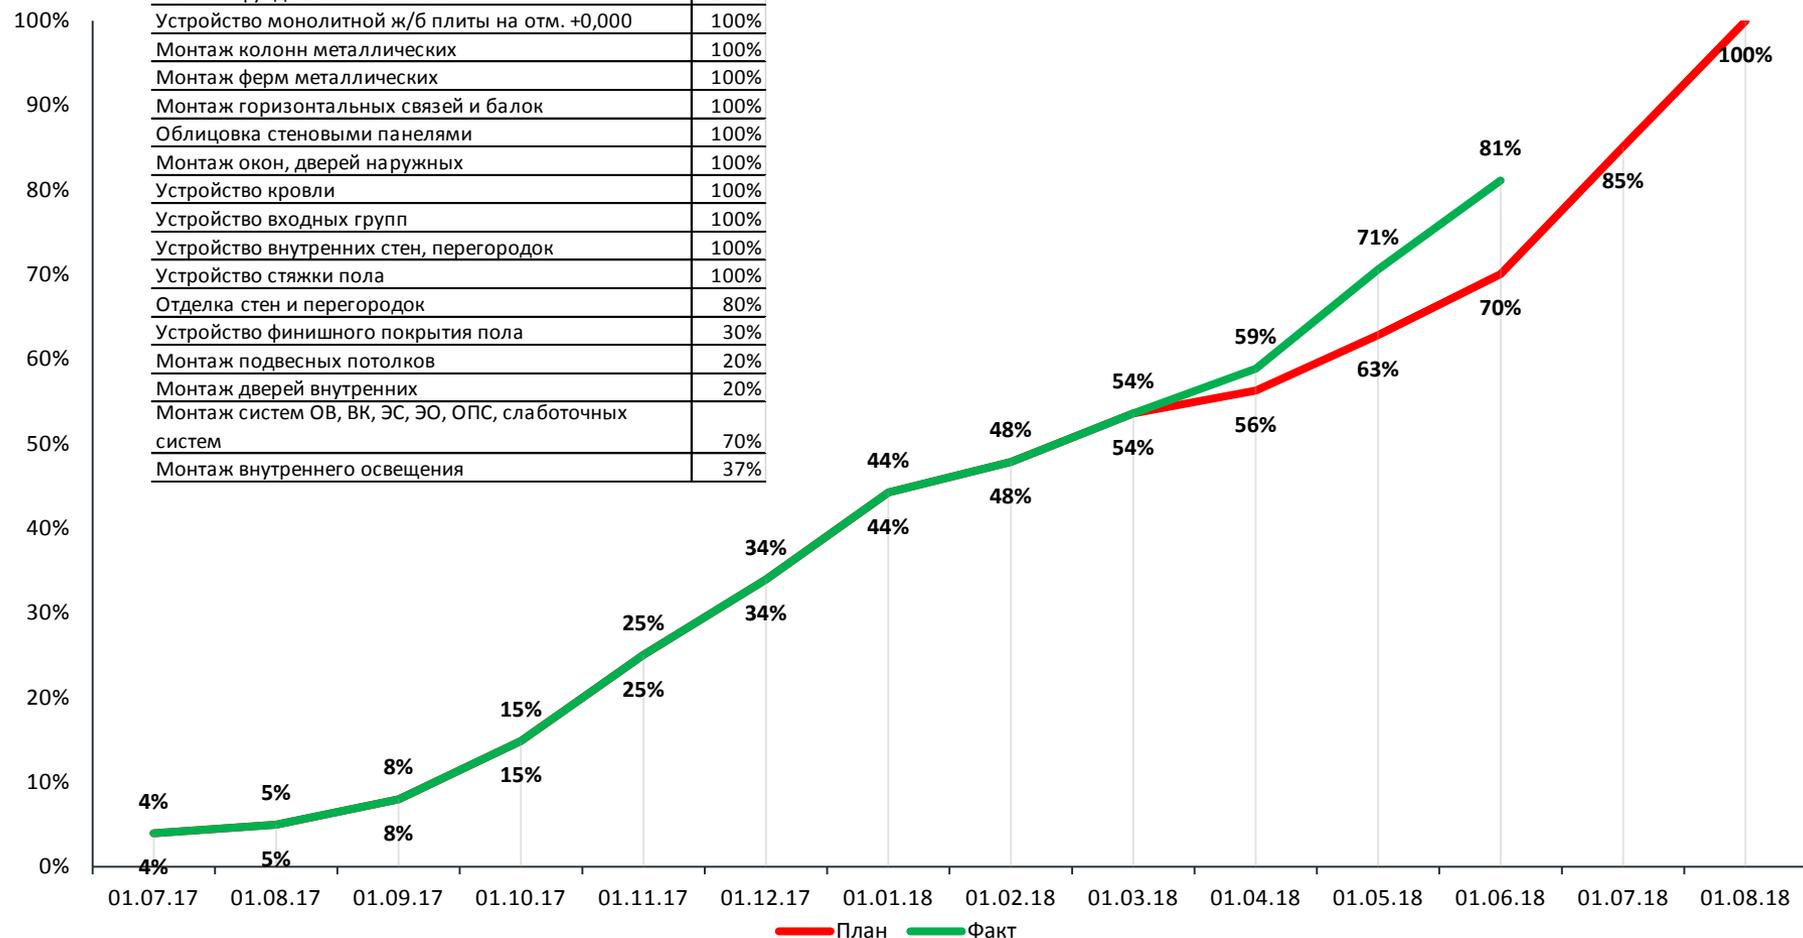

— План — Факт

# «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Барсово»

Срок реализации:  
2017-2018 гг.





**Спасибо за внимание!!!**

Администрация Сургутского района  
628408, Россия, Ханты-мансийский автономный округ-Югра,  
Тюменская область г. Сургут, ул. Энгельса, 10  
Тел./ф. 8(3462) 52-65-00,  
Адрес электронной почты: [glava@admsr.Ru](mailto:glava@admsr.Ru)
