



Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района

ОТЧЕТ об исполнении
Адресной инвестиционной
программы за **2018** год
и плане на **2019** год

Сургутский район

2019




ВСЕГО в 2018 году в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **исполнено:**

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2018 ГОДУ, МЛН. РУБ.

■ средства АО ■ средства МО ■ внебюджет

Всего профинансировано – **220 865,0 тыс. руб.**

- из средств ХМАО – 83 891,6 тыс. руб.,
- из средств местного бюджета – 11 497,0 тыс. руб.,
- Внебюджетные источники (ПАО «НК Роснефть») - 125 746,4 тыс.руб.

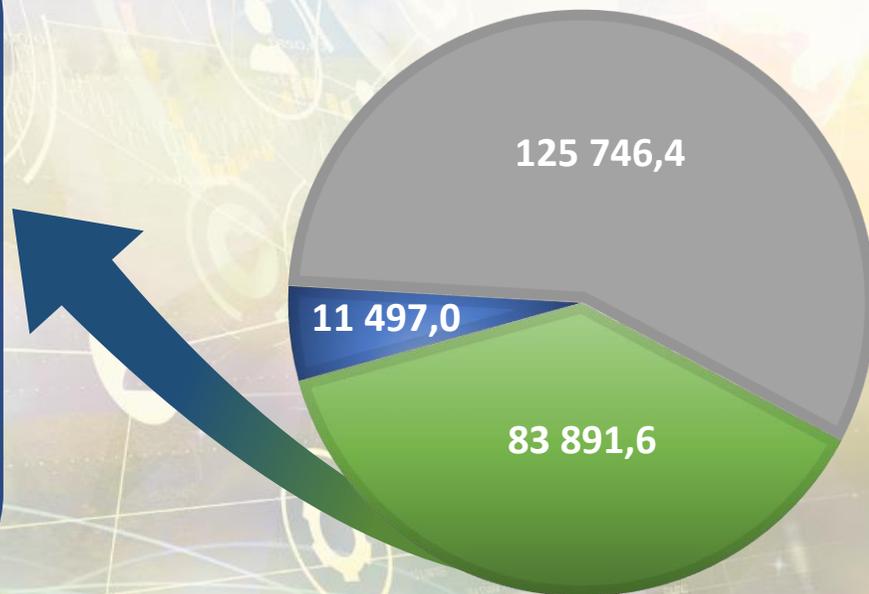



ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ:

Инженерные сети к многоквартирным жилым
домам мкр.6 пгт.Федоровский (2 этап)



Объект введен в
эксплуатацию



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Возможность строительства **12** жилых 5-9 этажных МКД
на **1076** квартир, общей площадью **69 774** кв. м



ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ:

Реконструкция улиц для организации автобусного движения п.Солнечный



Объект введен в эксплуатацию



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Ввод объекта позволит улучшить условия для организации автобусного движения и обеспечить устойчивое развитие посёлка Солнечный



НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ:

Реконструкция автомобильных дорог для
организации автобусного движения в
пгт.Белый Яр



Подрядчик - ООО СК «ЮВиС»
Окончание работ - сентябрь 2020 года
Цена контракта - 151 551,8 тыс. руб.

Готовность объекта - 52%.



Между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «НК «Роснефть» было заключено Дополнительное соглашение о финансировании социальных проектов Югры, в том числе на завершение строительства объекта «Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр» с объемом капвложений – **125 746,4 тыс.руб.**

В 2019 году в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет продолжено строительство объекта:

«Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в пгт. Белый Яр»

с объемом капвложений в размере - **57 299,2 тыс. руб.**, из них:

- 90% - это средства округа в сумме - **51 569,3 тыс. руб.**;

- 10% - это доля софинансирования средств бюджета района в сумме - **5 729,9 тыс. руб.**



Благодарю за внимание!

